

Novembro
de 2017

Relatório de acompanhamento dos projetos estratégicos da Justiça Federal

Acompanhamento dos projetos estratégicos da Justiça Federal, para o período
de 2015/2020



Sumário

Introdução	2
1. Carta de Serviços da Justiça Federal	5
Status: 12%.....	5
2. Estudos sobre a atratividade para ingresso e permanência na carreira de servidor da Justiça Federal	6
Status: Em execução - 69% desenvolvido	6
3. Novas demandas da JF: adequação da estrutura de cargos da área judiciária	7
Status: Não iniciado.....	7
4. Fortalecimento do clima organizacional, com ênfase na promoção da saúde no trabalho 8	
Status: Suspenso	8
5. Programa de sustentabilidade	9
Status: não iniciado	9
6. Nivelamento da infraestrutura de TI	9
Status: Em execução – 48%.....	9
7. Uniformização do desenvolvimento de sistemas informatizados	11
Status: Aguardando definições	11
8. Contratações conjuntas na área de TI	12
Status: Em execução – 40%.....	12
9. Desenvolvimento do Sistema Nacional de Cálculos em nova tecnologia	13
Status: Não iniciado.....	13
10. Pesquisa sobre demandas Repetitivas na Justiça Federal	14
Status: Em execução - 19%.....	14
11. Requisitos mínimos de funcionamento dos controles internos	15
Status: Sem informações.....	15
12. Processo Judicial Eletrônico da JF – PJe	16
Status: Em execução – 63%.....	16
13. Implantação do Modelo Nacional de Interoperabilidade MNI	17
Status: Em execução - 73%.....	17
14. Estudos visando alterações na LEF (Lei de Execuções Fiscais nº 6.830/80)	18
15. Depósitos Judiciais na Justiça Federal	19

Introdução

Os projetos estratégicos da Justiça Federal foram definidos no Plano Estratégico da Justiça Federal – PEJF para o período de 2015 a 2020 e resumem as iniciativas propostas para dar suporte ao alcance dos macrodesafios do período.

A portaria CJF-POR-2015/00092, de 2 de março de 2015, designou os gestores das iniciativas estratégicas, definindo também as suas atribuições.


Para acompanhamento dos projetos, foi desenvolvido módulo específico na ferramenta SEI, desenvolvida pelo TRF4. O módulo permite o acompanhamento da iniciativa, a partir da inserção do plano de projeto e das entregas com cronograma.

Com a finalidade de apresentar a situação atual de cada projeto, mesmo os que ainda não foram inseridos no módulo de projetos do sistema SEI, utilizaremos os status previstos no Manual de Gestão de Projetos da Justiça Federal, aprovado pela Portaria CJF-POR-2016/00023, de 19 de janeiro de 2016.

1. Não iniciado - Situação de projeto que pode estar no portfólio de projetos, mas a sua execução ainda não foi iniciada. Nenhuma atividade do projeto está sendo executada. Normalmente, este é o primeiro *status* de um projeto;
2. Em estruturação: Situação de projeto que inclui análise, categorização e aprovação da proposta inicial, elaboração do plano de projeto e respectiva aprovação;
3. Em execução: Situação de projeto que possui atividades em execução (qualquer atividade);
4. Suspenso: Situação de projeto que, por alguma determinação/tomada de decisão, tenha sido suspenso. Suspenso não significa que o projeto tenha sido cancelado, mas deverá aguardar alguma decisão para ter ou não sua execução retomada;
5. Cancelado: Situação na qual o projeto tenha sido cancelado temporariamente, ou seja, ele poderá voltar a ser executado, mas não existe uma previsão ou tenha sido cancelado definitivamente

- após a execução de algumas atividades. Os projetos cancelados poderão ser retomados futuramente;
6. Concluído: Situação de projeto que seguiu todo o seu ciclo de vida, estando concluídas todas as suas fases. Representa o último status de um projeto;
 7. Aguardando definições: Situação em que o projeto está com as suas atividades paralisadas aguardando definições do gestor e da alta administração;
 8. Excluído: Situação de projeto que também por alguma determinação/tomada de decisão tenha sido eliminado do portfólio sem que nenhuma atividade tenha sido iniciada. Os projetos excluídos não poderão ser retomados futuramente.

A seguir, apresentaremos a síntese do status dos projetos e o resumo de cada um deles, incluindo o objetivo e a fase de desenvolvimento.

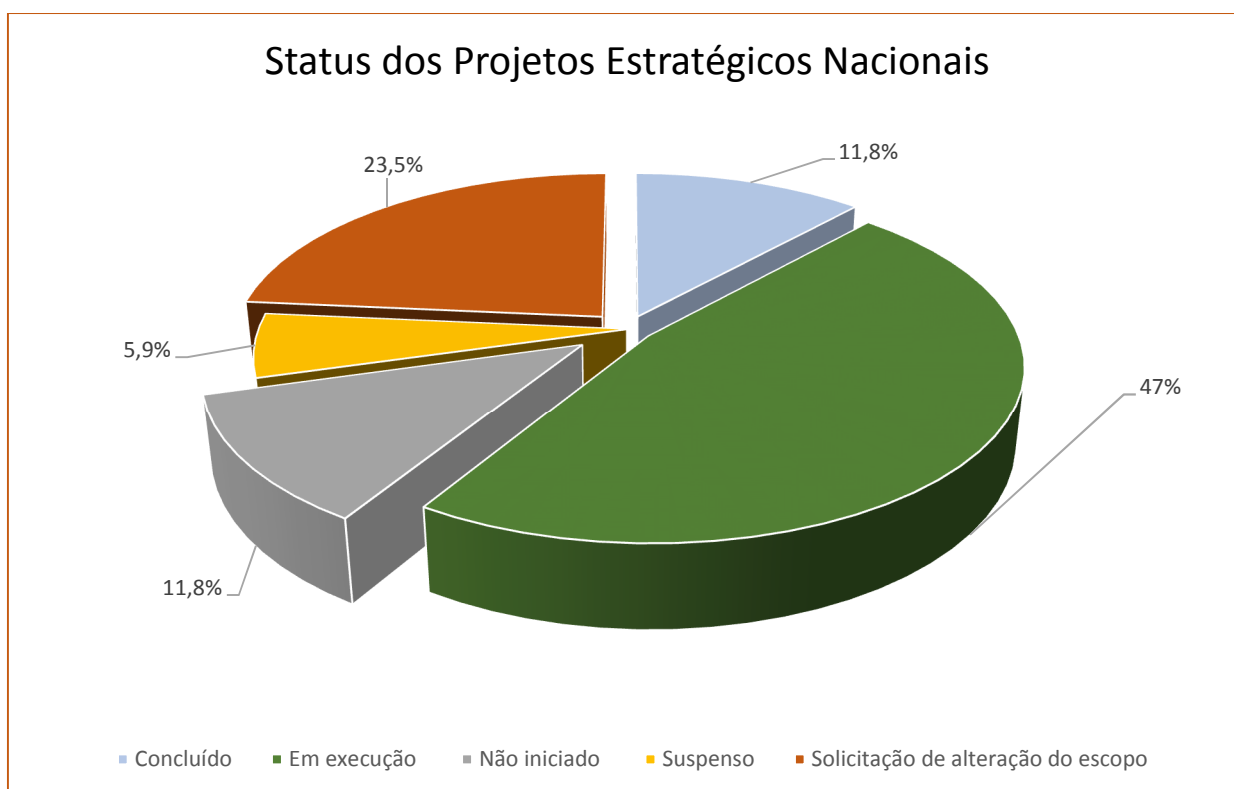

Status dos Projetos Estratégicos Nacionais

Novembro de 2017

Projeto	Status	Progresso
Implantação dos Sistemas Eletrônicos de Gestão Integrados - SEGI	Concluído	100%
Implementação do Sistema de Governança da Justiça Federal	Concluído	100%
Carta de Serviços	Em execução	18%
Estudos sobre a atratividade para ingresso e permanência na carreira de servidor da Justiça Federal.	Em execução	69%
Novas demandas da JF: adequação da estrutura de cargos da área judiciária.	Não iniciado	
Fortalecimento do clima organizacional, com ênfase na promoção da saúde no trabalho.	Suspenso	
Programa de Sustentabilidade.	Não iniciado	
Nivelamento da infraestrutura de TI.	Em execução	48%
Uniformização do desenvolvimento de sistemas informatizados.	Em execução	
Contratações conjuntas de TI.	Em execução	40%
Desenvolvimento do Sistema Nacional de Cálculos Judiciais em Nova Tecnologia.	Não iniciado	
Projeto de pesquisa sobre Demandas Repetitivas na Justiça Federal.	Em execução	19%
Requisitos mínimos de funcionamento dos controles internos.	Sem informações	
Implantação do PJe.	Em execução	63%
Implantação do Modelo Nacional de Interoperabilidade – MNI.	Em execução	73%
Estudos Visando Alterações na LEF.	Em estruturação	
Depósitos Judiciais.	Em estruturação	5%

1. Carta de Serviços da Justiça Federal

Gestor: Cintia da Silveira Lima

Gerente: Edimilson Cavalcante de Oliveira

Status: 12%

Objetivo do projeto: Disponibilizar aos cidadãos uma Carta de Serviços, que seja de fácil entendimento, acessível por qualquer pessoa e que possibilite ampliação do acesso à Justiça e à prestação jurisdicional célere.

Últimas ações:

- ✓ Levantar documentos;
- ✓ Estudar documentos.

[Nova Entrega](#) | [Visualizar EAP](#) | [Visualizar Cronograma](#) | [Histórico](#) | [@fócos](#) | [Voltar](#)

Planejamento: [Gestão Estratégica da Justiça Federal](#)
 Projeto: [Carta de Serviços da Justiça Federal](#) 12
 Responsável:

Ver todas as atividades | Ocultar todas as atividades

Lista de Entregas (6 registros):					
Identificação	Início	Término	RS	%	
1 Relatório de requisitos legais e técnicos elaborado	14/08/2017	22/09/2017		67	
1.1 Levantar documentos	25/10/2017	07/11/2017		100	
1.2 Estudar documentos	25/10/2017	07/11/2017		100	
1.3 Elaborar requisitos legais e técnicos	25/10/2017	22/09/2017		0	100 %
2 Relatório de diagnóstico dos serviços elaborado	25/09/2017	17/11/2017		0	
2.1 Identificar serviços dos órgãos	25/09/2017	08/10/2017		0	
2.2 Elaborar rol de serviços	06/10/2017	06/10/2017		0	
2.3 Priorizar serviços identificados	09/10/2017	20/10/2017		0	
2.4 Diagnosticar serviços priorizados	23/10/2017	17/11/2017		0	
3 Carta de serviço elaborada	20/11/2017	26/01/2018		0	
3.1 Elaborar projeto gráfico	20/11/2017	15/12/2017		0	
3.2 Especificar serviços priorizados	20/11/2017	12/01/2018		0	
3.3 Estabelecer critérios de monitoramento e avaliação	15/01/2018	26/01/2018		0	
4 Carta de serviços institucionalizada	29/01/2018	13/03/2018		0	
4.1 Aprovar na equipe de projeto	29/01/2018	29/01/2018		0	
4.2 Aprovar no Comitê Gestor - COGEST	30/01/2018	30/01/2018		0	
4.3 Aprovar no Colegiado - CJF	31/01/2018	13/03/2018		0	
5 Carta de serviços divulgada e sistema informatizado especificado	14/03/2018	10/04/2018		0	
5.1 Divulgar no Observatório da Estratégia da Justiça Federal - OE	14/03/2018	14/03/2018		0	
5.2 Divulgar nos portais da Justiça Federal de 1º e 2º graus e CJF	14/03/2018	14/03/2018		0	
5.3 Especificar processo de manutenção, monitoramento e avaliação da Carta de Serviços	14/03/2018	27/03/2018		0	
5.4 Criar banco de dados da Carta de Serviços	14/03/2018	10/04/2018		0	
5.5 Especificar sistema informatizado	14/03/2018	10/04/2018		0	
6 Projeto finalizado	11/04/2018	03/05/2018		0	
6.1 Revisar documentação	11/04/2018	24/04/2018		0	
6.2 Encerrar projeto no SEI	25/04/2018	25/04/2018		0	
6.3 Registrar lições aprendidas	26/04/2018	02/05/2018		0	
6.4 Arquivar documentação	03/05/2018	03/05/2018		0	

Próximos passos:

- ✓ Identificar os serviços dos órgãos;
- ✓ Elaborar rol de serviços;

- ✓ Priorizar serviços identificados;
- ✓ Diagnosticar serviços priorizados.

2. Estudos sobre a atratividade para ingresso e permanência na carreira de servidor da Justiça Federal

Gestor: Jean Carlo Batista de Oliveira

Gerente: Aline Ribeiro de Mendonça

Status: Em execução - 69% desenvolvido

Objetivo do projeto: Obter subsídios para propor iniciativas, mecanismos e estruturas de que tornem atrativo o ingresso e a permanência de servidores nas carreiras do Poder Judiciário da União e, em especial, do CJF e dos órgãos da Justiça Federal.

Acompanhamento: O Projeto está sendo acompanhado no módulo de projetos do SEI, encontra-se em desenvolvimento com algumas ações realizadas, conforme cronograma:

[Visualizar EAP](#) [Visualizar Cronograma](#) [Histórico](#) [Gráficos](#) [Voltar](#)

Planejamento: [Gestão Estratégica da Justiça Federal](#)

Projeto: [Estudos sobre a atratividade para ingresso e permanência na carreira de servidor da Justiça Federal](#) 69

Responsável:

[Ver todas as atividades](#) [Ocultar todas as atividades](#)

Identificação		Início	Término	RS	%
1	Levantamento junto aos TRFs e CJF dos índices de rotatividade dos últimos 3 anos.	21/03/2016	31/03/2016		100
1.1	Consultar acerca da utilização de índices de rotatividade, bem como metodologia de acompanhamento	01/02/2017	01/02/2017		100
2	Identificação de entrevista de desligamento dos TRFs e do CJF	21/03/2016	31/03/2016		100
2.1	Identificar a utilização de entrevista de desligamento nos órgãos do Poder Judiciário.	01/02/2017	01/02/2017		100
3	Construção de instrumento de entrevista de desligamento	04/04/2016	31/03/2017		100
3.1	Apresentação de minuta do instrumento de entrevista de desligamento.	01/02/2017	01/02/2017		100
3.2	Aprovação da minuta no âmbito da SGP	02/02/2017	31/05/2017		100
3.3	Apresentação do instrumento de entrevista de desligamento ao Sistema de RH	31/05/2017	14/07/2017		100
3.4	Aprovação do instrumento pelo Sistema de RH	24/08/2017	24/08/2017		100
4	Proposta de definição e padronização - Índice de Rotatividade	11/04/2016	31/03/2017		100
4.1	Proposta do indicador	02/02/2017	02/02/2017		100
4.2	Aprovação do indicador no âmbito da SGP	02/02/2017	31/05/2017		100
4.3	Apresentação da proposta de indicador ao Sistema de RH	31/05/2017	14/07/2017		100
4.4	Aprovação do indicador pelo Sistema de RH	24/08/2017	24/08/2017		100
5	Revisão bibliográfica sobre índice de rotatividade e entrevista de desligamento	01/04/2017	30/06/2017		100
5.1	Revisão bibliográfica - entrevista de desligamento	30/05/2017	24/08/2017		100
5.2	Revisão bibliográfica - índice de rotatividade	30/05/2017	24/08/2017		100
6	Aprovação e divulgação do padrão da Justiça Federal	01/07/2017	16/12/2017		50
6.1	Apresentação de Proposta de Resolução	08/06/2017	11/09/2017		100
6.2	Aprovação da Proposta de Resolução	06/11/2017	16/12/2017		0
7	Identificação da estrutura das carreiras típicas de Estado	01/02/2018	14/12/2018		0
8	Identificação os diferenciais das carreiras reconhecidamente atrativas	02/07/2018	29/06/2019		0

Próximos passos: Aprovação da proposta de resolução.

3. Novas demandas da JF: adequação da estrutura de cargos da área judiciária

Gestor: Sheila Campello Farias Gibaile

Gerente: Carlos Alberto Colombo – TRF 4

Status: Não iniciado

Objetivo do projeto:

- Geral:

Elaborar documento propondo a redefinição de atribuições e de estrutura de cargos da área judiciária dos órgãos da Justiça Federal.

- Específicos:

- ✓ Identificar quais as atribuições dos cargos da área judiciária necessárias para atender às demandas decorrentes do processo judicial eletrônico;
- ✓ Identificar a estrutura de cargos necessária para atender às demandas decorrentes do processo judicial eletrônico.

Acompanhamento: O projeto foi gerado no SEI e seu Plano de Projeto foi aprovado.

Acompanhamento do Gerente do Projeto

Planejamento: [Gestão Estratégica da Justiça Federal](#)

Projeto: [Novas demandas da JF: adequação da estrutura de cargos da área judiciária](#)

[Ver todas as atividades](#) [Ocultar todas as atividades](#)

[Visualizar EAP](#) [Visualizar Cronograma](#) [Histórico](#) [Gráficos](#) [Voltar](#)

Identificação		Início	Término	RS	%	Lista de Entregas (6 registros)
1	Definição do marco analítico-conceitual	01/09/2017	30/11/2018	0		
2	Levantamento dos impactos do processo judicial eletrônico na Justiça Federal	01/09/2017	30/11/2018	0		
3	Diagnóstico das demandas de novas competências decorrentes do processo judicial eletrônico	01/09/2017	30/11/2018	0		
4	Análise de cenários: alternativas de adequação da estrutura de cargos - estratégias	01/09/2017	30/11/2018	0		
5	Desdobramento das etapas seguintes do projeto	01/09/2017	30/11/2018	0		
6	Elaborar documento propondo a redefinição de atribuições e de estrutura de cargos da área judiciária	01/09/2017	30/11/2018	0		

Pendências: detalhar o projeto e dar início à execução.

4. Fortalecimento do clima organizacional, com ênfase na promoção da saúde no trabalho

Gestor: Sheila Campelo Farias Gibaile

Gerente: Sheila Campelo Farias Gibaile

Status: Suspenso

Objetivo do projeto:

- Geral:

Apresentar uma proposta de política de promoção à saúde no trabalho no âmbito da Justiça Federal.
- Específicos:
 - ✓ Identificar os principais fatores de adoecimento dos magistrados e servidores da Justiça Federal;
 - ✓ Definir pressupostos e diretrizes de promoção à saúde dos magistrados e servidores da Justiça Federal.

Acompanhamento: Na 5ª Reunião do COGEST, realizada em 20/03/2017, a Secretária de Gestão de Pessoas, Sheila Gibaile, propôs o sobrestamento do projeto, tendo em vista a divulgação a ser feita pelo CNJ dos dados sobre absenteísmo por doença e sobre realização de exames periódicos de saúde - EPS relativos a magistrados e servidores nos anos de 2015 e 2016. A Secretária informou que o CNJ deverá divulgar pesquisa nos moldes do Justiça em Números sobre o levantamento de dados relativos à saúde do servidor e do magistrado e que após a análise dessas informações o projeto será ajustado e reiniciado. O sobrestamento do projeto foi aprovado por unanimidade.

5. Programa de sustentabilidade

Gestor: Misael Guerra Pessoa de Andrade

Gerente: Luana Carvalho de Almeida

Status: não iniciado

Acompanhamento: Com a edição da Resolução 201, de 03 de março de 2015, do CNJ que dispõe sobre a criação e competência das unidades ou núcleos socioambientais nos órgãos e conselhos do Poder Judiciário e implementação do respectivo Plano de Logística Sustentável (PLS-PJ), foi pleiteada a possibilidade de exclusão deste projeto do portfólio de projetos da JF, uma vez que essa atribuição seria de competência da unidade ou núcleo. Diante desta possibilidade, o CJF apresentou a proposta de exclusão do projeto na Reunião do Comitê Gestor de Estratégica da Justiça Federal – COGEST. O COGEST, porém, definiu pela permanência do projeto no portfólio e, também, que o escopo do projeto é o monitoramento do cumprimento da Resolução CNJ n. 201/2015 pelos órgãos da Justiça Federal.

Pendências: gerar o projeto no módulo de projeto do SEI e elaborar o Plano de Projeto, para dar início à execução.

6. Nivelamento da infraestrutura de TI

Gestor: Jefferson Colombo Barbosa Xavier

Gerente: Jefferson Colombo Barbosa Xavier

Status: Em execução – 48%

Objetivos do projeto:

- Suprir as necessidades de infraestrutura tecnológica visando à melhoria da satisfação dos clientes internos e externos da Justiça Federal;

- Normalizar o padrão mínimo de infraestrutura a ser disponibilizada aos usuários de TI, tempo máximo de utilização, garantia e critérios para substituição;
- Assegurar que o sistema de TI da Justiça Federal atue de forma integrada e colaborativa, por meio da uniformização de procedimentos e metodologias, de modo a reduzir a heterogeneidade, permitindo a interoperabilidade, o melhor compartilhamento do conhecimento e a melhoria na execução das rotinas de trabalho, gerando economicidade e aumento da eficiência operacional.

Acompanhamento: O Projeto está sendo acompanhado no módulo de projetos do SEI, encontra-se em desenvolvimento conforme o cronograma:

[Visualizar EAP](#) [Visualizar Cronograma](#) [Histórico](#) [Gráficos](#) [Voltar](#)

Planejamento: Gestão Estratégica da Justiça Federal
 Projeto: Nivelamento da Infraestrutura de Tecnologia da Informação 49
 Responsável: _____

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

Lista de Entregas (8 registros):				
Identificação	Início	Término	R\$	%
100 1 Publicação da Resolução, que dispõe sobre a Política de Nivelamento de Infraestrutura de TI da JF.	21/08/2015	21/08/2015		100
100 1.1 Publicar resolução	15/04/2016	15/04/2016		100
100 2 Entrega de plano de trabalho e cronograma de atendimento aos critérios de nivelamento.	24/08/2015	16/12/2015		100
100 2.1 Encaminhar plano de trabalho e cronograma	15/04/2016	15/04/2016		100
100 3 Instruir processo com o plano de trabalho e cronogramas do CJF e das cinco Regiões da JF.	24/08/2015	22/04/2016		100
100 3.1 Elaborar despacho para encaminhamento dos documentos	15/04/2016	15/04/2016		100
100 3.2 Sugestões na indicação das prioridades dos itens de nivelamento	15/04/2016	29/07/2016		100
64 4 Exercício de 2016 - plano de trabalho.	24/08/2015	28/02/2017		34
100 4.1 Atualizar plano de trabalho e cronograma - 2016	15/04/2016	15/04/2016		100
100 4.2 Deliberação e aprovação pelo COGEST - 2016	01/03/2016	15/05/2016		0
100 4.3 Apresentação do relatório técnico 2016 quanto ao atendimento à Política de Nivelamento	01/01/2017	28/02/2017		0
60 5 Exercício de 2017 - plano de trabalho.	24/08/2015	28/02/2018		50
100 5.1 Atualizar plano de trabalho e cronograma - 2017	08/05/2017	08/05/2017		100
100 5.2 Revisar a Política de Nivelamento de Infraestrutura	22/08/2017	22/08/2017		100
100 5.3 Deliberação e aprovação pelo COGEST - 2017	01/08/2017	30/11/2017		0
100 5.4 Apresentação do relatório técnico 2017 quanto ao atendimento à Política de Nivelamento	01/01/2018	28/02/2018		0
100 6 Exercício de 2018 - plano de trabalho.	29/07/2016	28/02/2019		0
100 6.1 Atualizar plano de trabalho e cronograma - 2018	01/01/2018	28/02/2018		0
100 6.2 Deliberação e aprovação pelo COGEST - 2018	01/03/2018	15/05/2018		0
100 6.3 Apresentação do relatório técnico 2018 quanto ao atendimento à Política de Nivelamento	01/01/2019	28/02/2019		0
100 7 Exercício de 2019 - plano de trabalho.	30/11/2018	28/02/2020		0
100 7.1 Atualizar plano de trabalho e cronograma - 2019	01/01/2019	28/02/2019		0
100 7.2 Deliberação e aprovação pelo COGEST - 2019	01/03/2019	15/05/2019		0
100 7.3 Apresentação do relatório técnico 2019 quanto ao atendimento à Política de Nivelamento	01/01/2020	28/02/2020		0
100 8 Exercício de 2020 - plano de trabalho	30/11/2019	28/02/2021		0
100 8.1 Atualizar plano de trabalho e cronograma - 2020	01/01/2020	28/02/2020		0
100 8.2 Deliberação e aprovação pelo COGEST - 2020	01/03/2020	15/05/2020		0
100 8.3 Apresentação do relatório técnico 2020 quanto ao atendimento à Política de Nivelamento	01/01/2021	28/02/2021		0

Pendência: No II Encontro Executando a Estratégia da Justiça Federal, ocorrida em 13 e 14 de novembro de 2017, o Secretário de Tecnologia da Informação do CJF, apresentou os seguintes ajustes ao Plano de Projeto:

- ✓ Revisão da Resolução CJF n. 355/2015;
- ✓ Realização de licitações conjuntas dos itens de infraestrutura básica;

- ✓ Aprovação do cronograma de atendimento aos critérios de nivelamento.

7. Uniformização do desenvolvimento de sistemas informatizados

Gestor: André Ricardo Lapetina Chiaratto

Gerente: André Ricardo Lapetina Chiaratto

Status: Aguardando definições

Objetivo do projeto:

- Assegurar que o sistema de TI da Justiça Federal atue de forma integrada e colaborativa, por meio da uniformização de procedimentos e metodologias, de modo a reduzir a heterogeneidade, permitindo a interoperabilidade, o melhor compartilhamento do conhecimento e a melhoria na execução das rotinas de trabalho, gerando economicidade e aumento da eficiência operacional.
- Evitar a multiplicação desnecessária de esforços e dispêndio de recursos no desenvolvimento / aquisição de sistemas semelhantes em vários órgãos da JF. Realizar desenvolvimento/aquisição conjunta de sistemas, favorecer a integração de sistemas e informações e facilitar e melhorar o controle e a gestão.

Cronograma em revisão considerando o decidido na 19ª Reunião do Comitê Gestor Institucional - CGI.

Acompanhamento: De acordo com o entendimento do gestor do projeto, com a aprovação da resolução CJF n. 442/2017, de 02 de maio de 2017, que dispõe sobre o Modelo de Gestão para Sistemas de Informação Nacionais no âmbito do Conselho e da Justiça Federal, tem-se o atendimento do escopo e, a partir da conveniência de implantar um sistema nacional, torna-se necessário mapear as ações, definir os principais atores e papéis

indispensáveis à adoção de sistema de informação no âmbito da Justiça Federal.

Na 19ª Reunião do CGI, foi recusada a proposta feita pelo Secretário de Tecnologia da Informação, André Chiaratto, de finalizar o projeto, pois a Diretora-Geral ponderou que não houve nenhum sistema nacional deliberado pelo COGEST (PJe e SGRH) e sugeriu que a gestão do referido projeto não fique na STI, mas sim na alta administração. Foi proposto que seja revisto o escopo do projeto para que sejam feitos os ajustes necessários.

8. Contratações conjuntas na área de TI

Gestor: André Ricardo Lapetina Chiaratto

Gerente: André Ricardo Lapetina Chiaratto

Status: Em execução – 40%

Objetivo do projeto: Assegurar que o sistema de TI da Justiça Federal atue de forma integrada e colaborativa, por meio da uniformização de procedimentos e metodologias, de modo a reduzir a heterogeneidade, permitindo a interoperabilidade, o melhor compartilhamento do conhecimento e a melhoria na execução das rotinas de trabalho, gerando economicidade e aumento da eficiência operacional.

Acompanhamento: Projeto está sendo desenvolvido na STI/CJF. O Projeto está sendo acompanhado no módulo de projetos do SEI, de acordo com o cronograma:

Planejamento: [Gestão Estratégica da Justiça Federal](#)
 Projeto: [Contratações conjuntas na área de TI](#) 40

Responsável:

[Ver todas as atividades](#)
[Ocultar todas as atividades](#)

		Identificação	Início	Término	R\$	%
Lista de Entregas (5 registros):						
1	100	Realizar uma aquisição conjunta em 2015 (scanner - processo CJF-ADM-2015/00049)	23/06/2015	28/02/2016		100
	100	1.1 Identificar aquisição a ser realizada conjuntamente pelo CJF e TRFs	13/08/2015	13/08/2015		100
	100	1.2 Elaborar Documento de Oficialização de Demanda (DOD)	13/08/2015	13/08/2015		100
	100	1.3 Designar formalmente a equipe de planejamento da contratação	13/08/2015	13/08/2015		100
	100	1.4 Elaborar artefatos do Modelo de Contratações de Soluções de TI da Justiça Federal	13/08/2015	15/09/2015		100
	100	1.5 Realizar pesquisa de preços	15/09/2015	05/10/2015		100
	100	1.6 Aprovar o Termo de Referência	15/09/2015	15/09/2015		100
	100	1.7 Elaborar edital, ata e contrato	15/09/2015	10/11/2015		100
	100	1.8 Realizar a licitação	10/11/2015	02/12/2015		100
	100	1.9 Assinar contrato	15/12/2015	02/02/2016		100
	100	1.10 Adjudicar e homologar resultado da licitação	08/01/2016	02/02/2016		100
	100	1.11 Acompanhar início da execução do contrato	02/02/2016	02/02/2016		100
2	100	Realizar três aquisições conjuntas em 2017	02/01/2017	30/09/2017		100
	100	2.1 Identificar três aquisições a serem realizadas conjuntamente pelo CJF e TRFs	08/05/2017	08/05/2017		100
	100	2.2 Elaborar Documentos de Oficialização de Demanda (DOD)	08/05/2017	08/05/2017		100
	100	2.3 Designar formalmente a equipe de planejamento da contratação	08/05/2017	08/05/2017		100
	100	2.4 Elaborar artefatos do Modelo de Contratações de Soluções de TI da Justiça Federal	08/05/2017	08/05/2017		100
	100	2.5 Realizar pesquisa de preços	08/05/2017	08/05/2017		100
	100	2.6 Aprovar o Termo de Referência	22/08/2017	22/08/2017		100
	100	2.7 Elaborar edital, ata e contrato	22/08/2017	31/10/2017		100
3	0	Realizar quatro aquisições conjuntas em 2018	01/02/2018	30/09/2018		0
4	0	Realizar cinco aquisições conjuntas em 2019	01/02/2019	30/09/2019		0
5	0	Realizar seis aquisições conjuntas em 2020	01/02/2020	30/09/2020		0

Para 2017 estão previstas 3 aquisições conjuntas.

Próximos passos: Elaborar edital, ata e contrato.

9. Desenvolvimento do Sistema Nacional de Cálculos em nova tecnologia

Gestor: Dr. Marcos Augusto de Sousa

Gerente: Alexandre da Luz Ramires

Status: Não iniciado

Objetivo do projeto: Implementar as rotinas no módulo de benefício previdenciário indicadas pelo Comitê Gestor do SCJF e delimitadas no projeto corrente, no intuito de se eliminar a necessidade de elaboração de cálculos com o uso de planilhas eletrônicas pelos servidores da área de cálculos judiciais. Estima-se que, com a disponibilização de tais recursos, o tempo médio de elaboração do cálculo diminua em uma faixa de 30%.

Acompanhamento: O desenvolvimento do projeto está sob responsabilidade do TRF 1. O projeto foi inserido no módulo de projetos do SEI, ainda sem detalhamento.

Na 4ª reunião do COGEST, o gestor apresentou breve histórico do projeto e ressaltou as dificuldades que vem enfrentando com o modelo de contratação para desenvolvimento do sistema. Destacou que a alta rotatividade do pessoal terceirizado não permite a continuidade do desenvolvimento do sistema, de acordo com o planejado. Para contornar o problema, propôs a cessão provisória de um cargo vago de cada região que, ao final dos trabalhos, seriam devolvidos à origem. Não houve adesão das demais regiões para a proposta. (CJF-MRU-2016/00157).

Pendência: No II Encontro Executando a Estratégia da Justiça Federal, ocorrida em 13 e 14 de novembro de 2017, a servidora Erica apresentou as seguintes propostas:

- ✓ Finalização do módulo previdenciário do sistema;
- ✓ Previsão de encerramento em abril de 2018;
- ✓ Iniciar estudos de viabilidade para conversão para ambiente web.

Esta proposta deverá ser apresentada na próxima reunião do COGEST, para análise e aprovação.

10. Pesquisa sobre demandas Repetitivas na Justiça Federal

Gestor: Dra. Vânia Cardoso André de Moraes

Gerente: Jaqueline Aparecida Correia de Mello - CJF

Status: Em execução - 19%

Objetivo do projeto: Criar o núcleo de inteligência para prevenção das demandas repetitivas em âmbito nacional, proporcionando diminuição de custo e possibilidade de prevenção e gerenciamento de forma alinhada.

Acompanhamento: O projeto está sob responsabilidade de representante da 1ª Região. Está cadastrado na ferramenta do SEI e encontra-se na fase de criação do grupo de trabalho vinculado ao CEJ.

Cronograma inicial do projeto:

Planejamento: Gestão Estratégica da Justiça Federal
 Projeto: Projeto de pesquisa sobre Demandas Repetitivas na Justiça Federal 10
 Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

Lista de Entregas (4 registros):

Identificação	Início	Término	R\$	%
1 Criação do grupo de trabalho vinculado ao CEJ	01/02/2017	28/04/2017	0,00	75
1.1 Solicitação de indicação para as presidências	04/04/2017	04/04/2017	0,00	100
1.2 Encaminhar ofício convite para reunião inicial videoconferência	04/04/2017	04/04/2017	0,00	100
1.3 Reunião inicial videoconferência	08/06/2017	08/06/2017	0,00	100
1.4 Preparar portaria com a nomeação do grupo de trabalho	20/04/2017	28/04/2017	0,00	0
2 Estudos dos dados - coleta 1	20/04/2017	31/05/2018	0,00	0
2.1 Coleta de dados dos processos em andamento na JF	01/05/2017	29/06/2017	0	0
2.2 Mapeamento do fenômeno das demandas repetitivas e identificação de sua possível origem - coleta 1	29/06/2017	08/07/2017	0	0
2.3 Análise dos resultados pelo grupo de trabalho, com auxílio de especialistas, se necessário	29/06/2017	18/08/2017	0	0
2.4 Elaboração de notas técnicas com a proposição de medidas de intervenção	10/07/2017	24/08/2017	0	0
3 Validação da metodologia	30/10/2017	18/11/2017	0	0
4 Institucionalização do núcleo de inteligência	01/10/2018	17/11/2018	0,00	0

Pendência: No II Encontro Executando a Estratégia da Justiça Federal, ocorrida em 13 e 14 de novembro de 2017, a gestora do projeto, Dra. Vânia Cardoso André de Moraes, apresentou proposta para alteração de escopo do projeto para implantação do Centro Nacional e Local de Inteligência.

Esta proposta deverá ser apresentada na próxima reunião do COGEST, para análise e aprovação.

11.Requisitos mínimos de funcionamento dos controles internos

Gestor: Pedro Hikaru Oishi

Gerente: Pedro Hikaru Oishi

Status: Sem informações

Objetivo do projeto: O projeto Requisitos mínimos de Controles Internos deve prover a instituição de mecanismos de controle e monitoramento da gestão que apoiem a Alta Administração na tomada de decisões. A estruturação de um sistema de controle interno enseja a identificação dos riscos mais significativos para os objetivos dos Tribunais e o desenvolvimento de controles internos voltados à mitigação ou eliminação desses riscos.

Pendências:

Pendência: No II Encontro Executando a Estratégia da Justiça Federal, ocorrida em 13 e 14 de novembro de 2017, o gestor do projeto, Pedro Hikaru Oishi, apresentou as seguintes propostas:

- ✓ Conversão do projeto na política de gestão de riscos (Resolução 447 de 07 de junho de 2017);
- ✓ Formação de grupos temáticos para implementação de Política Gestão de Riscos (TI, aquisições, estratégia).

Esta proposta deverá ser apresentada na próxima reunião do COGEST, para análise e aprovação.

12. Processo Judicial Eletrônico da JF – PJe

Gestor: Dr. Marcelo Velasco Nascimento Albernaz

Gerente: Edimilson Cavalcante de Oliveira - CJF

Status: Em execução – 63%

Objetivo do projeto: Implantar o PJe no Conselho e na Justiça Federal de primeiro e segundo graus. Racionalizar o uso dos recursos orçamentários destinados às despesas com os sistemas processuais informatizados existentes.

Acompanhamento: O Projeto está sendo acompanhado no módulo de projetos do SEI.

Cronograma:

Planejamento: [Gestão Estratégica da Justiça Federal](#)
 Projeto: [Implantação do Processo Judicial Eletrônico - PJe](#)

Responsável:

[Ver todas as atividades](#)
[Ocultar todas as atividades](#)

					Lista de Entregas (4 registros):	
Identificação	Início	Término	R\$	%		
84 1 Implantação na 1ª Região				84		
1.1 Fase preparatória	23/10/2015	23/10/2015		100		
1.2 Implantação no 1º Grau	02/08/2016	28/12/2018		59		%
1.3 Implantação no 2º Grau	02/08/2016	01/12/2014		93		%
0 2 Implantação na 2ª Região				0		
2.1 Fase preparatória	01/01/2018	31/12/2019		0		
2.2 Implantação no 1º Grau	01/01/2018	31/12/2019		0		
2.3 Implantação no 2º Grau	01/01/2018	31/12/2019		0		
76 3 Implantação na 3ª Região				76		
3.1 Fase preparatória	23/10/2015	23/10/2015		100		
3.2 Implantação no 1º Grau	02/08/2016	28/12/2018		42		%
3.3 Implantação no 2º Grau	02/08/2016	20/12/2018		85		%
90 4 Implantação na 5ª Região				90		
4.1 Fase preparatória	23/10/2015	23/10/2015		100		
4.2 Implantação no 1º Grau	02/08/2016	30/11/2010		68		%
4.3 Implantação no 2º Grau	02/08/2016	05/06/2017		100		

Pendências:

- Migração da 5ª Região para a versão nacional;
- Definição do cronograma de implantação para a 2ª Região.

13. Implantação do Modelo Nacional de Interoperabilidade MNI

Gestor: Dr. Eduardo Picarelli

Gerente: Cristian Ramos Prange

Status: Em execução - 73%

Objetivo do projeto: Identificar as necessidades de interoperabilidade entre os órgãos que atuam na Justiça Federal para utilização do sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe e outros sistemas.

Acompanhamento: Projeto está em desenvolvimento e é coordenado por representante do TRF4. Encontra-se em pleno desenvolvimento com diversas ações realizadas, de acordo com o cronograma:

Planejamento: [Gestão Estratégica da Justiça Federal](#)
 Projeto: [Interoperabilidade na Justiça Federal](#) 73

Ver todas as atividades Ocultar todas as atividades

		Identificação	Início	Término	R\$	%	Lista de Entregas (3 registros)
64	1	Gerenciamento do Projeto	12/05/2015	16/06/2017		64	
100	1.1	Iniciação	01/04/2016	01/04/2016		100	
90	1.2	Acompanhamento e Avaliação	01/04/2016	15/06/2016		90	
0	1.3	Encerramento	16/06/2017	16/06/2017		0	
100	2	Implantação do Modelo Nacional de Interoperabilidade - MNI	01/03/2016	16/06/2017		100	
100	2.1	Definição da versão do MNI a ser adotada	30/03/2016	30/03/2016		100	
100	2.2	Integração com STJ e STF via MNI	30/03/2016	30/03/2016		100	
100	2.3	Integração ao Escritório Digital do CNJ	30/03/2016	13/07/2016		100	
100	2.4	Integração com a TNU	30/03/2016	13/07/2016		100	
100	2.5	Integração com PGFN	01/04/2016	01/06/2017		100	
53	3	Integrações extra-MNI	30/03/2016	16/06/2017		53	
95	3.1	Integração com INSS	30/03/2016	20/12/2016		95	
10	3.2	Integração com a CEF	30/03/2016	16/06/2017		10	

Pendências: No II Encontro Executando a Estratégia da Justiça Federal, ocorrida em 13 e 14 de novembro de 2017, o gestor do projeto, o Juiz Federal Dr. Eduardo Picarelli apresentou as seguintes propostas de ajuste no escopo:

- ✓ Priorizar a integração com o DATAPREV e BACENJUD (sem custos para a JF);
- ✓ Acompanhamento da atualização do MNI junto ao CNJ.

14. Estudos visando alterações na LEF (Lei de Execuções Fiscais nº 6.830/80)

Gestor: Dr. Anderson Furlan Freire da Silva

Gerente: Mario Procopiuck - SJPR

Status: Sem informações

Objetivo do projeto: Não informado

Acompanhamento: O projeto não foi gerado no módulo de projeto do SEI, não sendo possível realizar o seu acompanhamento.

Pendências: No II Encontro Executando a Estratégia da Justiça Federal, ocorrida em 13 e 14 de novembro de 2017, o gestor do projeto, o Juiz Federal Dr. Anderson Furlan Freire da Silva, apresentou as seguintes propostas de alteração:

1. Escopo:
 - ✓ Customização das rotinas informatizadas de execução fiscal;
 - ✓ Realização de projeto piloto (4ª e 5ª Regiões).
2. Estruturação de novos projetos:
 - ✓ Estudo de viabilidade de Portal de Alienação de bens;
 - ✓ Criação de portal de boas práticas.

Esta proposta deverá ser apresentada na próxima reunião do COGEST, para análise e aprovação.

15. Depósitos Judiciais na Justiça Federal

Gestor: Jorge Antonio Maurique

Gerentes Regionais:

1ª Região - Desembargador Federal Hercules Fajoses;

2ª Região – Juiz Federal Wilson José Witzel;

3ª Região - Juiz Federal Paulo César Neves Júnior;

4ª Região - Desembargador Federal Jorge Antonio Maurique;

5ª Região - Jaelson Rodrigues Ferreira.

Status: Em execução

Objetivo do projeto: Regularização dos depósitos judiciais em processos baixados e em processos em tramitação com valores desbloqueados, bem como dos depósitos realizados em nome dos beneficiários de requisições de pagamento e precatórios, com a destinação dos valores às partes ou a conversão em renda para a União.

Acompanhamento:

- O projeto foi inserido no módulo de projetos do SEI;



- Realizada a primeira reunião, em 17 de outubro de 2017, para estruturação do projeto.
